

内装工事の流れ

天井・壁・床や建具(ドア・窓など)など今度は目に見えてくる工事が始まります。工種もさらに増えていきます。




壁/間仕切壁<軽量鉄骨下地>…二重床完了後、床に位置出しを行い軽量鉄骨下地で、部屋の間仕切りを立て天井の下地を組みます。



天井・壁/ボード貼り…壁、天井に石膏ボード9.5mmを貼ります。

建具(ドア)の吊込…ドアなどは先に枠を取付、仕上げが完了したら扉を吊込みます。

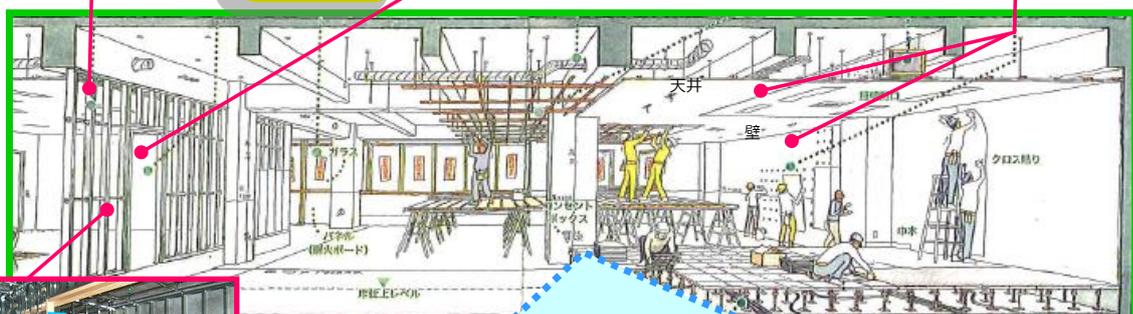

木枠

木枠・家具取付…開口部の木枠や家具を取付ます。

実際の現場ではその他に、下記の取付を行っています。



キッチン据付…システムキッチンを据付、給排水の配管を接続します。



玄関石貼り…玄関部分の上り框(かまち)(写真：赤丸)と床石を貼ります。

ついに、最上階24階のコンクリート打設をしました!(^_^)!



現場のアレコレ

オイルタンクについて…停電対応として、発電機にオイルタンクを設置しています。重油18,000Lあり、3日分を確保することができ、停電時でも電気を発電する事が可能となります。

